


# Rijn-Gouwelijn Oost

<b>Gebied</b>	Zuidvleugel
<b>Onderwerp</b>	Regionale/lokale infrastructuur
<b>Ministerie</b>	IenM
<b>Fase</b>	Realisatie

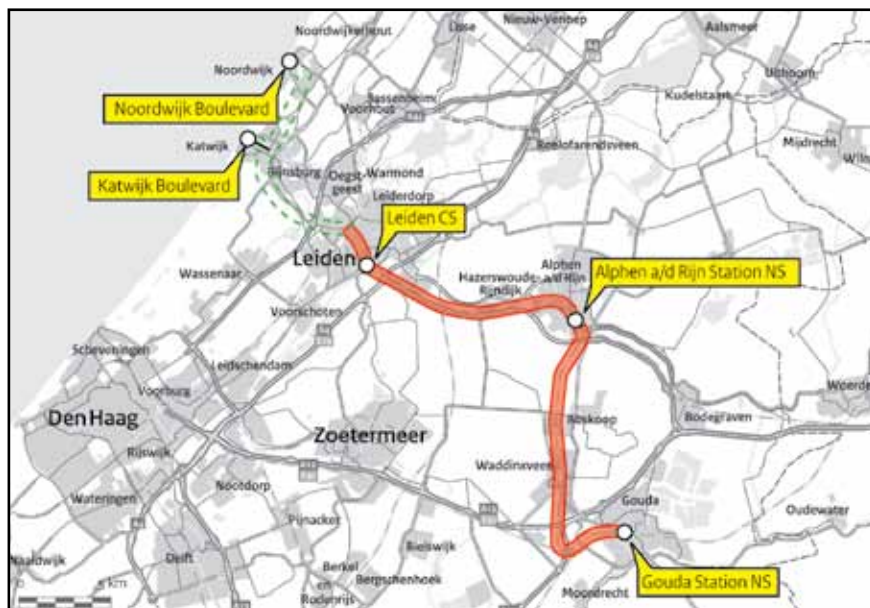

**Opgave** De kwaliteit van het openbaar vervoer (attractiviteit, structurerende werking en kostendekkingsgraad) in de Rijn-Gouwe-corridor en de leefbaarheid van de binnenstad van Leiden zijn onvoldoende.

**Oplossing** Een lightrail-verbinding op de corridor Gouda-Alphen a/d Rijn-Leiden-Katwijk-Noordwijk. Het project is gesplitst in twee delen, te weten RGL Oost en RGL West. Voor het project RGL Oost (Gouda-Alphen a/d Rijn-Leiden) is inmiddels een subsidieaanvraag ingediend. RGL West (Leiden-Katwijk-Noordwijk) wordt beoordeeld in relatie tot de bouwopgave (zie projectblad Rijn-Gouwelijn West).

## Planning

Start realisatie: 2009

Oplevering: 2015

**Financiën** Voor RGL-Oost is een rijksbijdrage van € 151 mln gereserveerd (bedrag basisjaar € 140 mln).

**Politiek/bestuurlijk** In 2009 hadden de provincie en Leiden overeenstemming bereikt over het tracé in Leiden (via Hooigracht/Langegracht); hiervoor is een bestuursovereenkomst getekend. Het nieuwe college van Leiden wil niet meewerken aan een tram door het centrum en onderzoekt alternatieven. De provincie maakt een inpassingsplan voor het eerder afgesproken tracé.

Het nieuwe college van GS Zuid-Holland kiest in haar hoofdlijnenakkoord voor het beter benutten van het bestaande spoor tussen Alphen en Leiden Centraal voor Oost en een vertrammbare busbaan voor West (tussen Leiden Centraal en Katwijk/Noordwijk).

**Uitvoering** Door de keuze van het nieuwe college moeten de plannen opnieuw worden uitgewerkt. De provincie en betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

## Projecthistorie

	'07	'08	'09	'10	'11	'12
Algemeen				•		
MIRT fase	•					
Opgave						
Oplossing					•	
Planning			•			
Financiën						
Pol./Best.					•	•

## Toelichting op de wijzigingen

**2007:** het project is overgegaan van de planstudiefase naar de realisatiefase.

**2009:** door de discussie in Leiden over het tracé door de binnenstad heeft het project vertraging opgelopen. De oplevering is nu voorzien voor 2015, waarbij oost en west gelijktijdig in gebruik worden genomen.

**2010:** er is overeenstemming over het tracé in Leiden (via Hooigracht/Langegracht). Subsidieaanvraag moet door provincie worden ingediend.

**2011:** VenW en de provincie hebben afgesproken dat de B&I kosten voor het spoor tussen Alphen en Leiden A4 door ProRail/VenW worden gedragen. Het nieuwe college van Leiden wil niet meewerken aan een tram door het centrum; de provincie maakt een inpassingsplan.

**2012:** de subsidieaanvraag is in 2010 ingediend. Door de keuze van GS voor een andere oplossing moeten de plannen opnieuw worden uitgewerkt. De subsidieaanvraag kan pas verder in behandeling worden genomen nadat er duidelijkheid is over de uitvoering van het project.
